

4.1.9 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หมวดงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินกันเหลือปี)

1. ก่อสร้างอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาเยี่ยง ตำบลนาเยี่ยง อำเภอเขาเยี่ยง จังหวัดอุบลราชธานี

☞ งบประมาณตามสัญญาจ้าง 4,250,000 บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 สิงหาคม 2568

☞ เบิกจ่ายไปแล้ว วงดที่ 1 และ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,487,000.00 บาท

ผลการดำเนินงาน

☞ **งานงวดที่ 3** เป็นเงินจำนวน 1,062,500.00 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดงานดังนี้

- งานวางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตพื้นชั้นที่ 2 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- งานเทคอนกรีตเสาชั้นที่ 2 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 2 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- งานเทคอนกรีตคานรับโครงสร้างหลังคา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- งานวางระบบท่อน้ำสำหรับห้องน้ำชั้นที่ 2 ยังไม่ดำเนินการ
- งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบหลังคา ยังไม่ได้ดำเนินการ

☞ **งานงวดที่ 4** เป็นเงินจำนวน 1,062,500.00 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดงานดังนี้

- งานก่ออิฐพร้อมฉาบปูนผนังชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ผู้รับจ้างก่ออิฐผนังชั้นที่ 1 เรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการก่อผนังชั้นที่ ๒

- ติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด ยังไม่ได้ดำเนินการ
- งานปูกระเบื้อง ยังไม่ได้ดำเนินการ
- งานทำพื้นผิวทั้งหมด ยังไม่ได้ดำเนินการ
- งานทาสีอาคาร ยังไม่ได้ดำเนินการ
- งานติดตั้งระบบประตูหน้าต่าง ยังไม่ได้ดำเนินการ
- งานระบบสุขภัณฑ์ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- งานระบบไฟฟ้า ยังไม่ได้ดำเนินการ

☞ **งวดสุดท้าย** เป็นจำนวนเงิน 637,500.00 บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 15 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- งานระบบปรับอากาศ
- งานก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมด
- ทดสอบการใช้งานระบบต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
- ส่งมอบครุภัณฑ์อื่นๆ ที่กำหนดในสัญญาให้ครบถ้วน
- ทำความสะอาดบริเวณทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดงบลงทุน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดงบลงทุน ปี 2567

1. ก่อสร้างอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาเยี่ยง ตำบลนาเยี่ยง อำเภอเขาเยี่ยง จังหวัดอุบลราชธานี



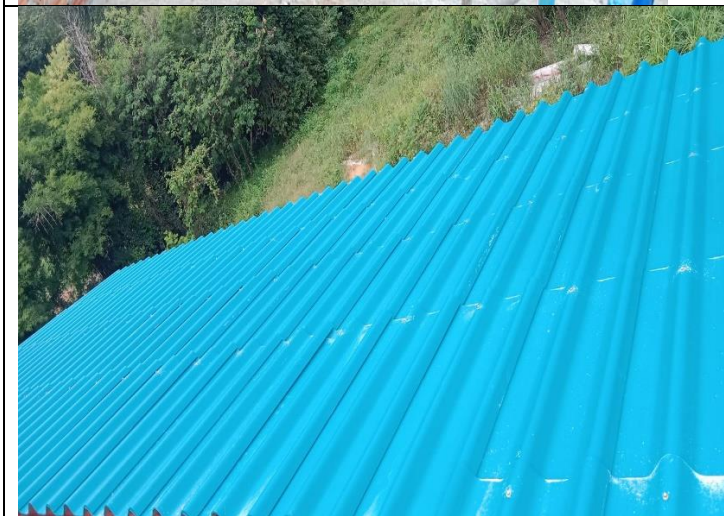



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม)

1. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 แควีเอ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ใช้งบประมาณตามสัญญาจ้าง 519,135.16 บาท สัญญาสิ้นสุด 7 ก.ค. 68

คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย



2. โครงการก่อสร้างหอถังประปาบาดาลขนาดเล็ก (5.00 ลบ.ม.) สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ใช้งบประมาณตามสัญญาจ้าง 294,234.00 บาท สัญญาสิ้นสุด 24 มิถุนายน 2568
คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

