

4.1.10 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินกันเหลือในปี)

1. ก่อสร้างอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยี่ย ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

☞ งบประมาณตามสัญญาจ้าง 4,250,000 บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 สิงหาคม 2568

☞ เบิกจ่ายไปแล้ว วงดที่ 1 และ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,487,500.00 บาท

ผลการดำเนินงาน

☞ งานงวดที่ 3 เป็นเงินจำนวน 1,062,500.00 บาท (หนึ่งล้านบาท หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดงานดังนี้

- งานวางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตพื้นชั้นที่ 2 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- งานเทคอนกรีตเสาชั้นที่ 2 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 2 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- งานเทคอนกรีตคานรับโครงสร้างหลังคา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- งานวางระบบท่อน้ำสำหรับห้องน้ำชั้นที่ 2 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบหลังคา อยู่ระหว่าง

ดำเนินการมุงหลังคา

☞ งานงวดที่ 4 เป็นเงินจำนวน 1,062,500.00 บาท (หนึ่งล้านบาท หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดงานดังนี้

- งานก่ออิฐพร้อมฉาบปูนผนังชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ดำเนินการก่อผนังและฉาบเรียบร้อยแล้ว
- ติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด ติดตั้งงานฝ้าเพดานชั้นที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เหลือชั้นที่ 2
- งานปูกระเบื้อง ยังไม่ได้ดำเนินการ
- งานทำพื้นผิวทั้งหมด อยู่ระหว่างดำเนินการ
- งานทาสีอาคาร อยู่ระหว่างดำเนินการ
- งานติดตั้งระบบประตูกุญแจต่าง ยังไม่ได้ดำเนินการ
- งานระบบสุขภัณฑ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- งานระบบไฟฟ้า อยู่ระหว่างดำเนินการ

☞ งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 637,500.00 บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 15 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศ
- งานก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมด
- ทดสอบการใช้งานระบบต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
- ส่งมอบครุภัณฑ์อื่นๆ ที่กำหนดในสัญญาให้ครบถ้วน
- ทำความสะอาดบริเวณทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดงบประมาณ



งบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดงบประมาณ ปี 2567

1. ก่อสร้างอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอเอราเีย ตำบลนาเอีย อำเภอเอราเีย จังหวัดอุบลราชธานี

งานชั้นที่ 1



งานติดตั้งกระเบื้องห้องสุขา

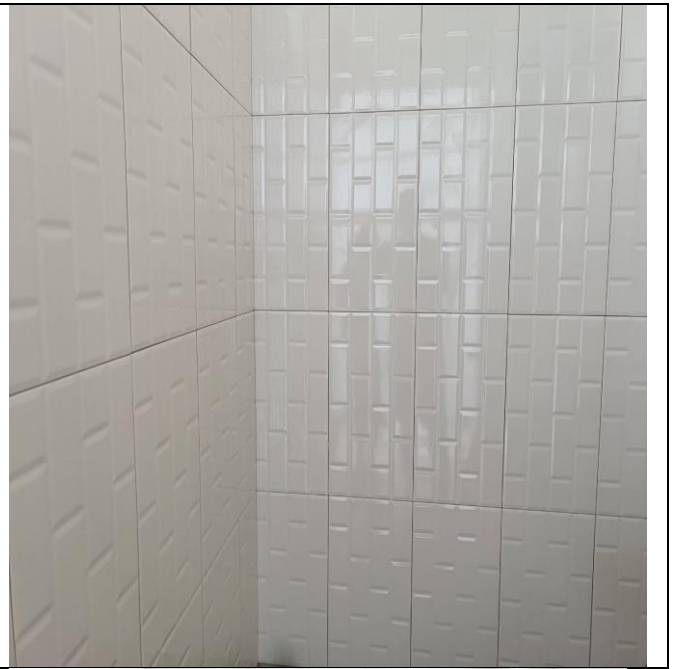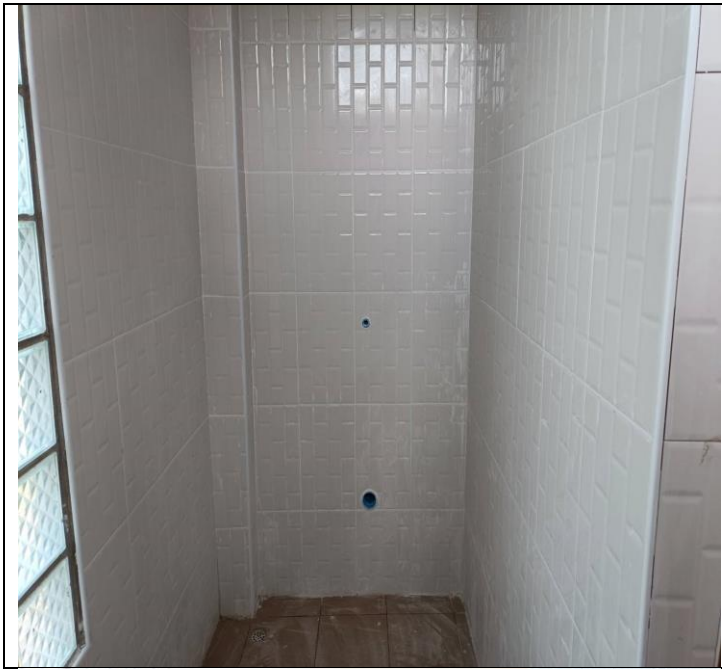

งานโครงสร้างชั้นที่ 2



